


現地調査(築上町立八津田小学校建設事業)

実施: 令和5年2月9日(木)14:00から

工期内完了【校舎本体】

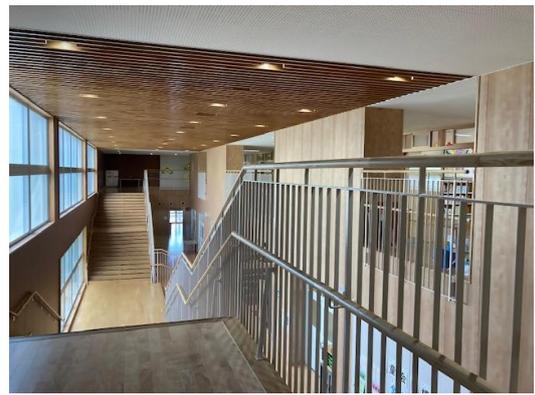

工期遅延分①【外構その1】



・校名・校章板



・インターロッキング敷設
・花壇
・ソーラー照明



・インターロッキング敷設 ・時計 ・花壇



・インターロッキング敷設 ・校門下コンクリート敷設

工期遅延分②【信号機移設】



・アスファルト舗装 ・校門下コンクリート敷設



・アスファルト舗装 ・校門下コンクリート敷設



・アスファルト舗装 ・校門下コンクリート敷設

【駐車場】 令和5年2月9日(木) 現在



【正門進入路】 令和5年2月9日(木) 現在



【防災倉庫】 令和5年2月9日(木) 現在

